

Координатор проекта со стороны Пограничного муниципального округа:

Борщенко Ирина Альбертовна телефон 8 (42345) 21-7-00

Место реализации проекта: с. Богуславка Пограничного муниципального округа

Планный объем финансирования:

Всего — 3 030 303,00 руб., в том числе:

Средства краевого бюджета — 3 000 000,00 руб.

Средства бюджета Пограничного муниципального округа — 30 303,03 руб.

Фактические расходы:


Всего — 2 222 520,43 руб., в том числе:

Средства краевого бюджета — 2 200 295,23 руб.




Средства бюджета Пограничного муниципального округа (софинансирование) — 22 225,20 руб.

До начала проекта:



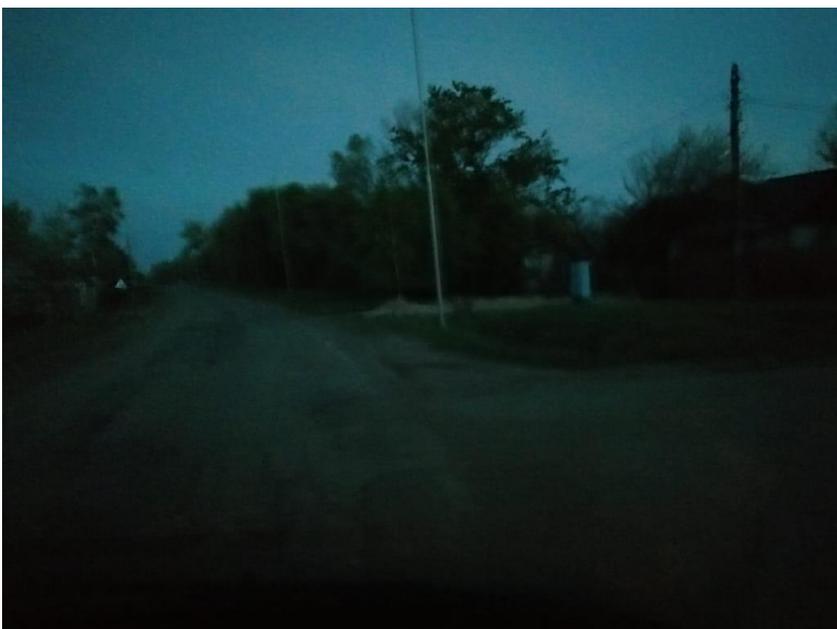

После окончания проекта:

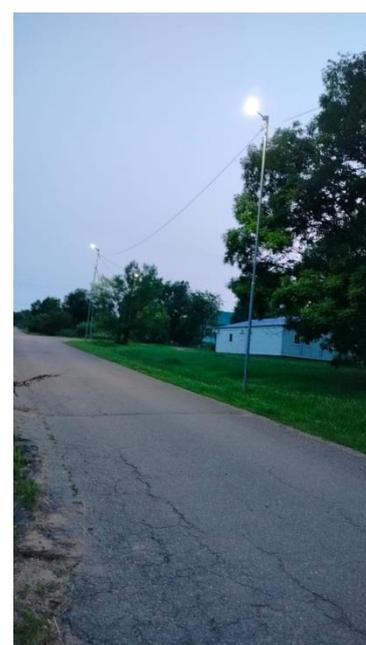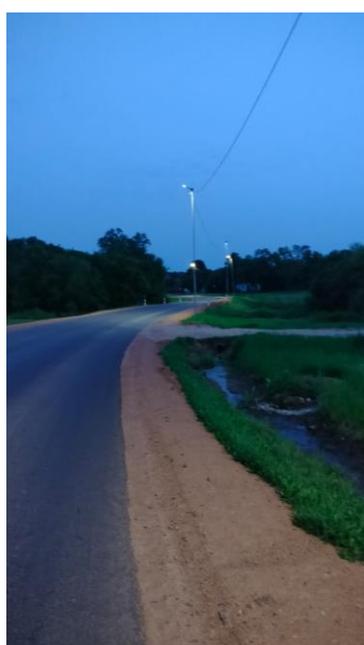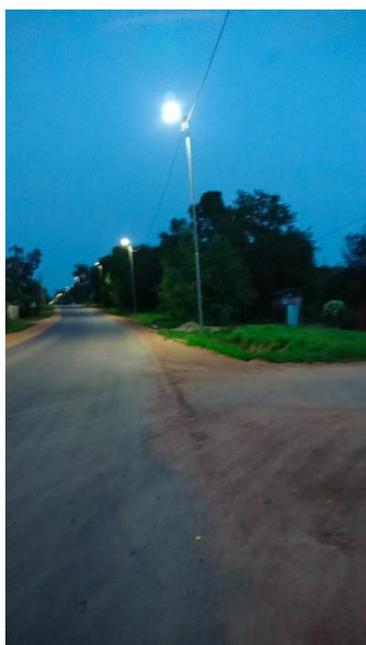

В селе полностью отсутствуют освещение улиц, что затрудняет видимость в темное время и при непогоде; создает опасные условия для передвижения жителей, не позволяет контролировать обстановку в селе.

Мероприятия по реализации проекта:

Установка уличного освещения в селе

Ожидаемые результаты:

Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика села в вечернее и ночное время суток.
